


**Comer bien también
es dar amor.**



**Fecha del Reporte
17/10/2025**



NutriHuella AVANCE

Proyecto de Título – Ingeniería en Informática (Duoc UC)



ESCUELA DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

Nuestro equipo

Personas, ciencia y cariño por tu mascota.



Leandro Valenzuela

Product Owner



Gonzalo Troncoso

Scrum Master



Alexander Orell

Scrum Team

AGENDA

01 Compromiso

02 Avances

03 Riesgo

04 Trello

05 Compromisos Próxima clase




01 Compromiso sesión anterior

	Compromiso Abierto		Compromiso Atrasado		Compromiso Cerrado		En Proceso
--	--------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	------------

ID	Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de Compromiso	Fecha de Cierre	Estado	Comentarios
WEB						
HU-018	Plan diario IA	L.Valenzuela	03-10-2025	16-10-2025	Cerrado	Implementar la generación automática de un plan de alimentación diario usando IA según los datos registrados de la mascota.
HU-019	Plan semanal IA	L.Valenzuela	03-10-2025	17-10-2025	Cerrado	Desarrollar la funcionalidad para que el sistema genere un plan semanal de nutrición de manera automática y personalizada.
HU-020	Plan adaptado a despensa	L.Valenzuela	03-10-2025	17-10-2025	Cerrado	Integrar la IA con el inventario de la despensa, ajustando los planes nutricionales a los ingredientes disponibles.
APP						
MO-80	Registro de mascota	A.Orell	03-10-2025	24-10-2025	En proceso	Crear el formulario en la app para registrar nueva mascota con datos básicos (nombre, raza, edad, peso inicial).
MO-81	Resumen clínico	A.Orell	03-10-2025	25-10-2025	En proceso	Desarrollar la vista donde el usuario pueda consultar el historial clínico consolidado de su mascota.
MO-82	Edición de ficha clínica	A.Orell	03-10-2025	26-10-2025	En proceso	Implementar la opción para editar y actualizar la ficha clínica de la mascota con nuevos datos médicos.
MO-83	Registro de vacunas	A.Orell	04-10-2025	27-10-2025	En proceso	Incorporar la funcionalidad para ingresar y consultar las vacunas aplicadas a la mascota.
QA						
MO-70	Resumen clínico	G.Troncoso	03-10-2025	17-10-2025	Cerrado	Pruebas QA sobre la correcta visualización y actualización del resumen clínico en la aplicación.
MO-71	Registro de ficha clínica	G.Troncoso	03-10-2025	17-10-2025	Cerrado	Validar en QA que los registros realizados en la ficha clínica se guarden y reflejen correctamente.
MO-72	Registro de vacunas	G.Troncoso	03-10-2025	17-10-2025	Cerrado	Ejecutar pruebas QA para verificar el registro de vacunas y la consistencia de datos en la app.
MO-73	Registro de enfermedades	G.Troncoso	04-10-2025	18-10-2025	Cerrado	Realizar pruebas QA sobre la función de registro de enfermedades y su integración con el historial clínico.
DOCUMENTACION						
MO-89	Completar modelo 4+1	G.Troncoso	04-10-2025	18-10-2025	En proceso	

02 Avances

Bourndown Sprint 4

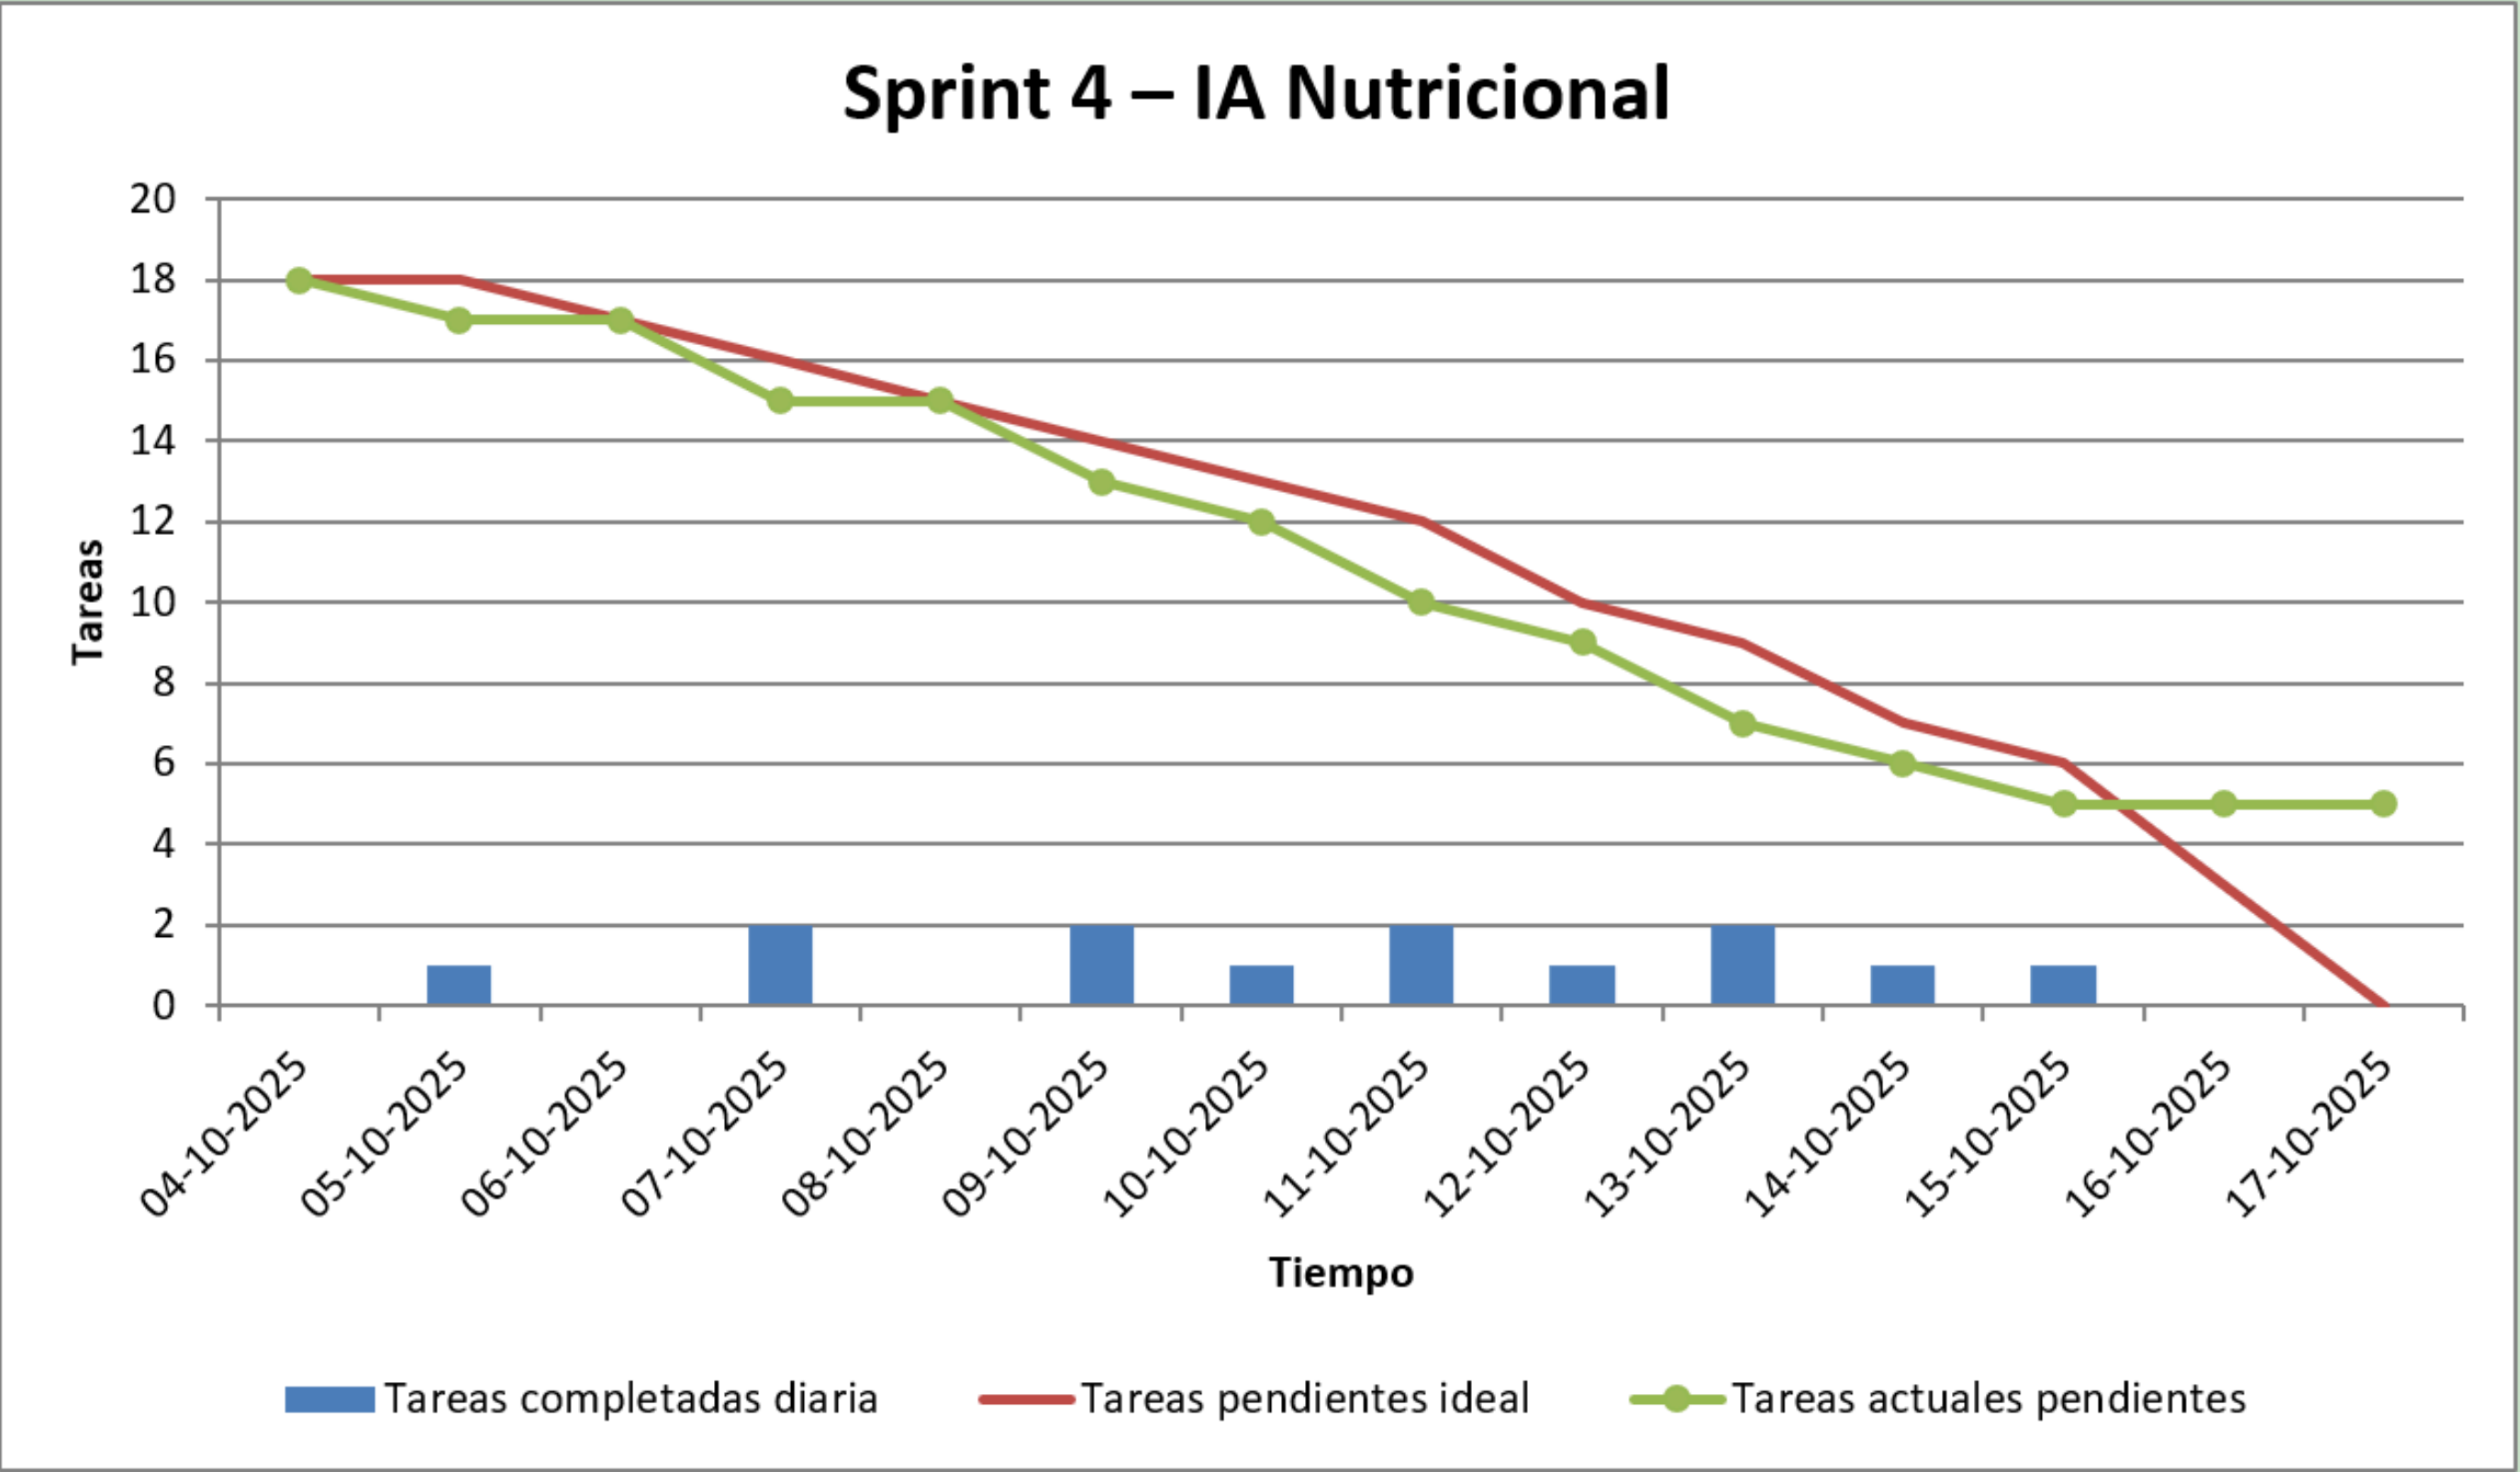

Resumen

Fecha del Reporte

17/10/2025



Fecha de Inicio

10/10/2025

Fecha de Fin

17/10/2025

ESTADO ANTERIOR

Avance Real 48%

Avance Esperado 52%

Desviacion -4%

Estado ●

ESTADO ACTUAL

Avance Real 57%

Avance Esperado 62%

Desviacion -5%

Estado ●

Logros

Se logro implementar IA la cual, utilizando los datos de mascota y despensa, genera una receta con instrucciones para preparar.

Explicación del Desvió

-5%


La desviación es negativa no se ha logrado completar 5 tareas por lo tanto estamos por bajo la curva.

Esto se debió a que se dedicó gran parte del tiempo a la implementación de la IA.

Por esta razón, no fue posible completar las tareas MO-80, MO-81, MO-82 y MO-83, correspondientes a la aplicación móvil.

En cuanto a la documentación, la tarea MO-89 aún no ha sido finalizada; resta completar los casos de uso y definir la forma en que se presentará la documentación final.

Curva de Avance Planificado vs Real

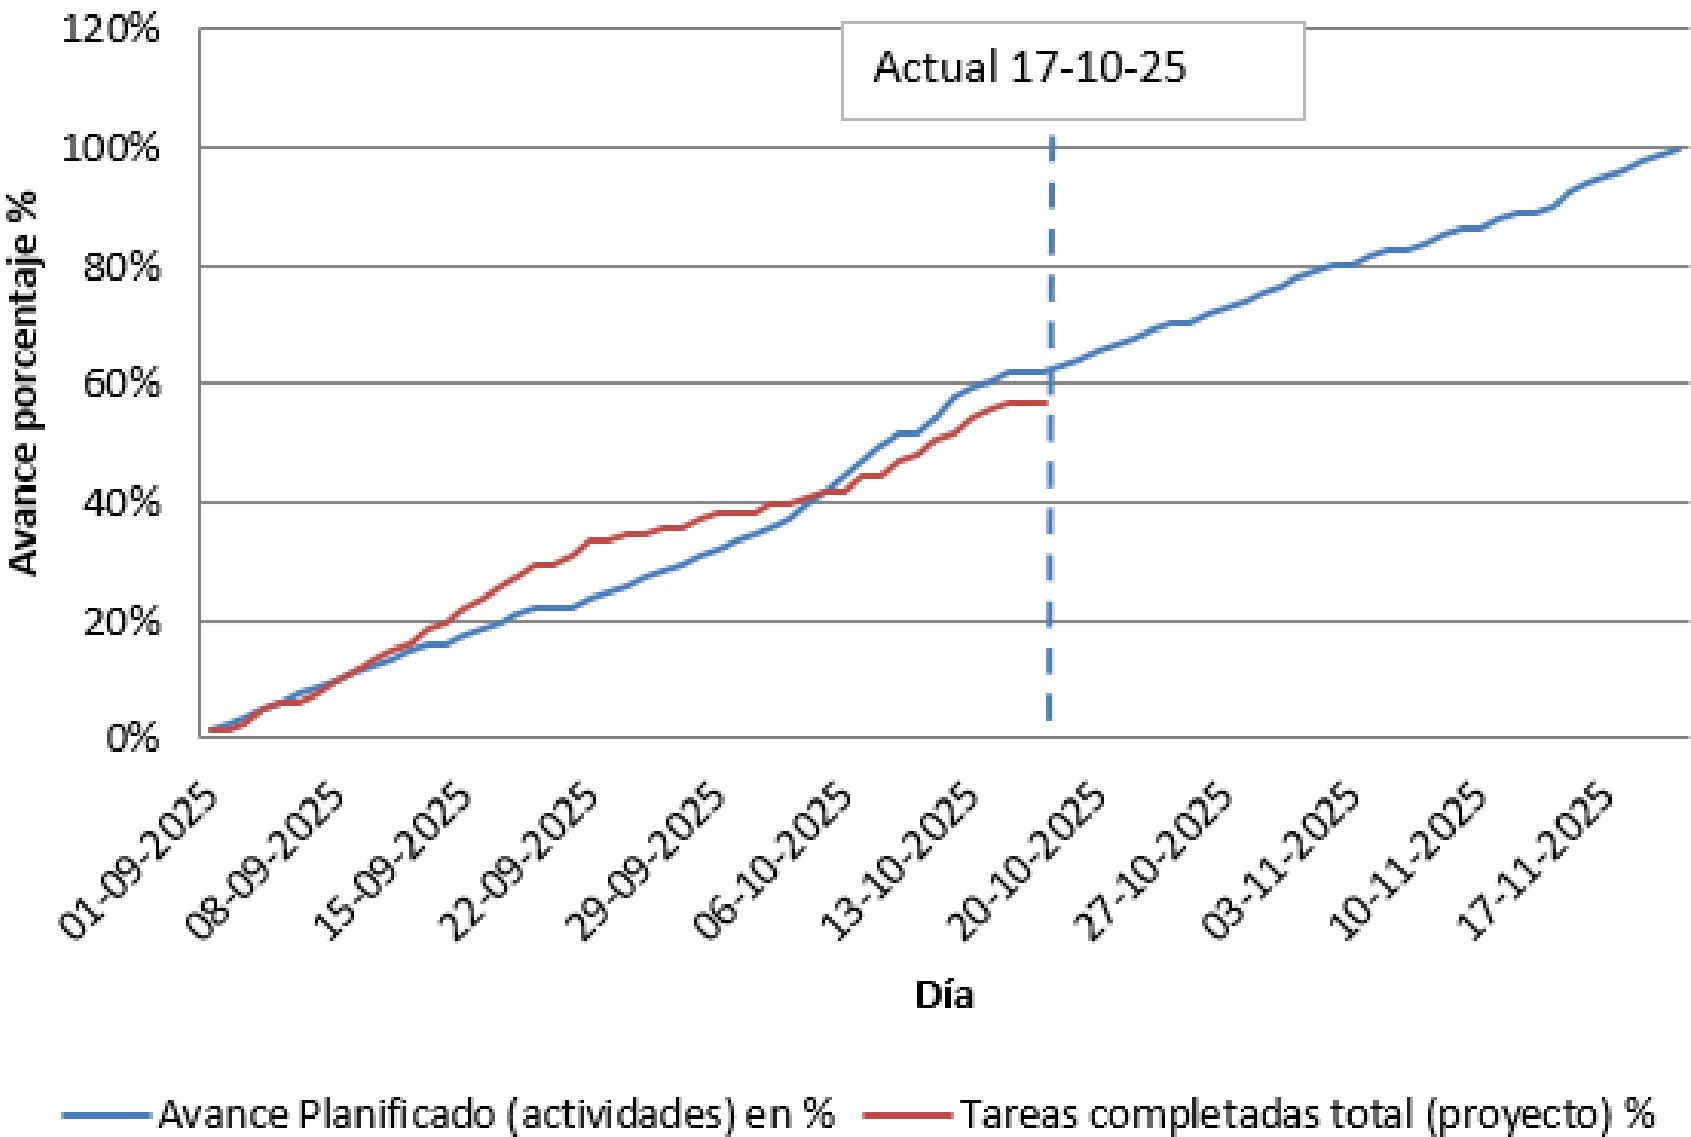

Riesgo asociado

03 Riesgo

ID	RIESGO	Nivel	PLAN DE MITIGACION	RESPONSABLE	TIPO DE IMPACTO	PLAZO DE IMPLEMENTACION	ESTADO
R-07	Subestimación del tiempo necesario para completar tareas.	Alto	Estimar con márgenes, dividir tareas grandes y revisar el plan periódicamente.	Leandro Valenzuela	Gestión y planificación	01/11/2025	Abierto
R-08	Reuniones sin actas ni acuerdos claros.	Moderado	Designar responsable de acta y enviarla al finalizar cada reunión.	Alexander Orell	Comunicación y coordinación	21/11/2025	Abierto

Registro de incidencia

ID	Descripcion del problema	criticidad	acciones	Responsable	Fecha de cierre(estimada de cierre)	ESTADO
I-05	IA tiene límite de consultas	Alto	Usar IA local	Leandro	16/10/2025	Cerrado
I-06	Errores en testing de proyecto por diferentes IA	Alto	Se elige solo una IA para test	Leandro	18/10/2025	Cerrado

04 Riesgo

[illegible]

05 Compromisos

ID	Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de Compromiso	Fecha de Cierre	Comentarios
APP					
MO-80	Registro de mascota	A.Orell	03-10-2025	24-10-2025	Crear el formulario en la app para registrar nueva mascota con datos básicos (nombre, raza, edad, peso inicial).
MO-81	Resumen clínico	A.Orell	03-10-2025	24-10-2025	Desarrollar la vista donde el usuario pueda consultar el historial clínico consolidado de su mascota.
MO-82	Edición de ficha clínica	A.Orell	03-10-2025	24-10-2025	Implementar la opción para editar y actualizar la ficha clínica de la mascota con nuevos datos médicos.
MO-83	Registro de vacunas	A.Orell	04-10-2025	24-10-2025	Incorporar la funcionalidad para ingresar y consultar las vacunas aplicadas a la mascota.
MO-84	Registro de peso	A.Orell	17-10-2025	24-10-2025	Permitir al usuario registrar periódicamente el peso de la mascota para seguimiento en el tiempo.
MO-86	Eliminación de mascota	L.Valenzuela	17-10-2025	24-10-2025	Agregar la opción para eliminar un registro de mascota, manteniendo trazabilidad y validaciones de seguridad.
DOCUMENTACION					
MO-89	Completar modelo 4+1	G.Troncoso	04-10-2025	24-10-2025	

**Comer bien también
es dar amor.**



“Muchas gracias ”
